Helsebygg Midt-Norge

Hovedfremdriftsplan byggefase 2

Baseline revisjon 20
Revisjons dato : 25.01.2010
Status dato : 21.01.2010

ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Vellykket flytting
20	Akutten og Hjerte-lunge-senteret, inkl. kjøkken og sterilsentral	199,4 u	15.02.06	10.12.09	07.05.10
33	Gastrosenteret sørfløy - klargjøre til permanent bruk	10 u	18.01.10	26.03.10	07.05.10
34	Riving lungebygget (17,18)	15 u	04.06.10	16.09.10	-
35	Riving kjøkken, tøyutlevering og kantine (12,14,15)	12 u	15.02.10	07.05.10	-
36	Gårdshage Gastrosenteret	19,6 mndr	03.05.10	01.11.11	-
37	Gårdshage Bevegelsessenteret	12,7 mndr	10.05.10	28.04.11	-
38	Riving føden med kontorrigg (07)	16 u	28.05.10	16.09.10	-
39	Riving av Høyblokka m/ omkringliggende hus (08,09,19,20,21,24-1,25-1,26-1,27,29,44)	47,2 u	04.06.10	29.04.11	-
40	Harald Hardrådes gate	148 u	01.11.10	30.08.13	-
41	Olav Kyrres Plass	126,2 u	01.04.11	30.08.13	-
42	Kunnskapssenteret	125,6 u	02.05.11	25.09.13	31.10.13

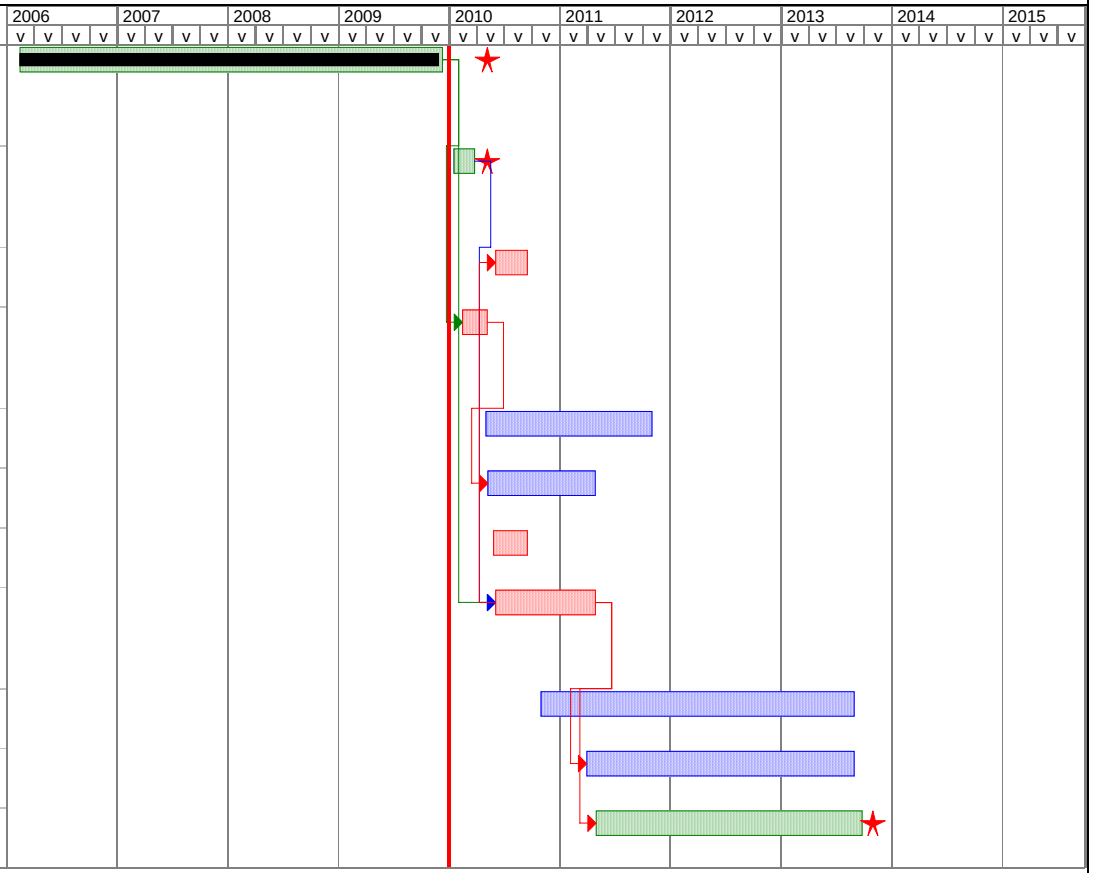

Infrastruktur
Bygging
Riving
Bekreftet vellykket flytting
Rehabilitering
Fremdrift
Drift

Versjon : Hovedfremdriftsplan fase 2 rev. 20 250110
Utskriftsdato :25.01.10
